


佐賀県玄海町

住所	〒847-1421 佐賀県東松浦郡玄海町諸浦34
町長	脇山 伸太郎
HP	https://www.town.genkai.lg.jp/soshiki/2/10049.html
バイオマス産業都市選 定年度	2019年度
バイオマス産業都市構想	https://www.jora.jp/wp-content/uploads/2021/02/genkai.pdf
担当部署	農林水産課
連絡先 TEL	0955-52-2199
連絡先 FAX	0955-52-3041
連絡先 E-mail	nourinsuisan@town.genkai.lg.jp

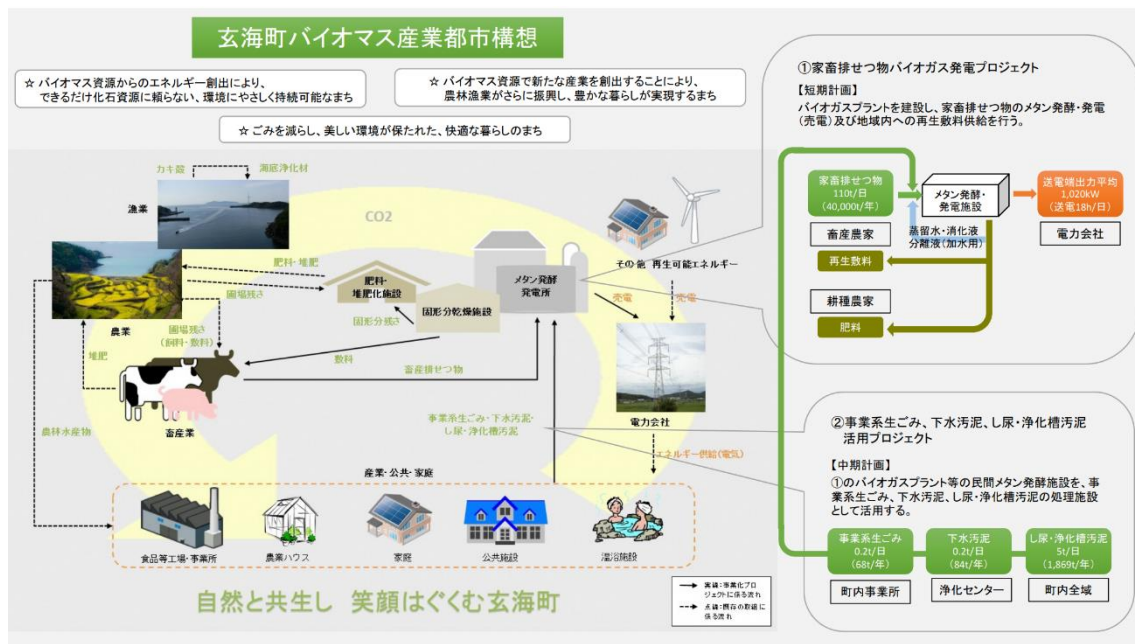

事業化プロジェクトの概要

名称	家畜排せつ物バイオガス発電プロジェクト	
実施主体	シンコー株式会社	
使用する技術	メタン発酵発電	
概要 (計画)	バイオマス原料	家畜ふん尿（肉用牛、酪農牛、肉豚）
	原料処理量(t/年)	40,552 t /年
	原料投入量(t/年)	40,552 t /年
	生産物	肥料、再生敷料、（液肥）
	発電量(kwh/年)	6,500MWh/年
	FITの適用	<input checked="" type="checkbox"/> FIT適用 <input type="checkbox"/> FIT対象外
	堆肥化の場合は製造量(t/年)	たい肥：14,600.0m ³ /年 再生敷料：18,980m ³ /年
	液肥生産量(t/年)	液肥：0m ³ /年（希望者への提供は可能）

バイオマス事業の進捗状況

事業化プロジェクト名	進捗状況
家畜排せつ物バイオガス発電プロジェクト	着工前（農地転用申請前）

事業の経営状況

事業化プロジェクト	計画との進捗比較 ※	事業実施による効果 地域波及効果の発現状況)	
		効果	数値化
家畜排せつ物バイオガス発電プロジェクト	C 計画より遅れている	未定	未定

※ A)計画以上に進捗している B)ほぼ計画通り C)計画より遅れている D)進んでいない

停滞要因

事業化プロジェクト	停滞要因
家畜排せつ物バイオガス発電プロジェクト	<ul style="list-style-type: none">・新型コロナ流行の影響により事業の進捗が遅れている・プロジェクトについて、国庫事業を利活用する計画だったが、着工時期等の事情により、事業の利用をせず、事業主体の自己資金での事業計画へ変更となり、事業主体が融資等を受ける必要が生じたため

運営上の課題

事業化プロジェクト	運営上の課題
家畜排せつ物バイオガス発電プロジェクト	<ul style="list-style-type: none">・事業主体と畜産農家の運営業務の振り分け・単価設定（原料、生産物）・原料・生産物（再生敷料）の搬入出が滞りなくできるか・畜産農家から原料を必要量確保できるか・畜産農家が生産する再生敷料を消費できるか・事業主体が運転開始及びプラント運営を継続できるか

バイオマス産業都市推進協議会による支援の希望の有無（有・無）

受けたい支援内容

・事業計画・内容及び全般に対する助言や指導
